


Výstavba chodníků Prachovice u Dašic sil. III/322 55


termín: 2.3. - 31.5.2026

- uzavřený úsek 700 m
- objíždná trasa 9,15 km

Stávající DZ v rozporu s DIO bude zneplatněno.
Přístup k nemovitostem v koordinaci se stavbou.

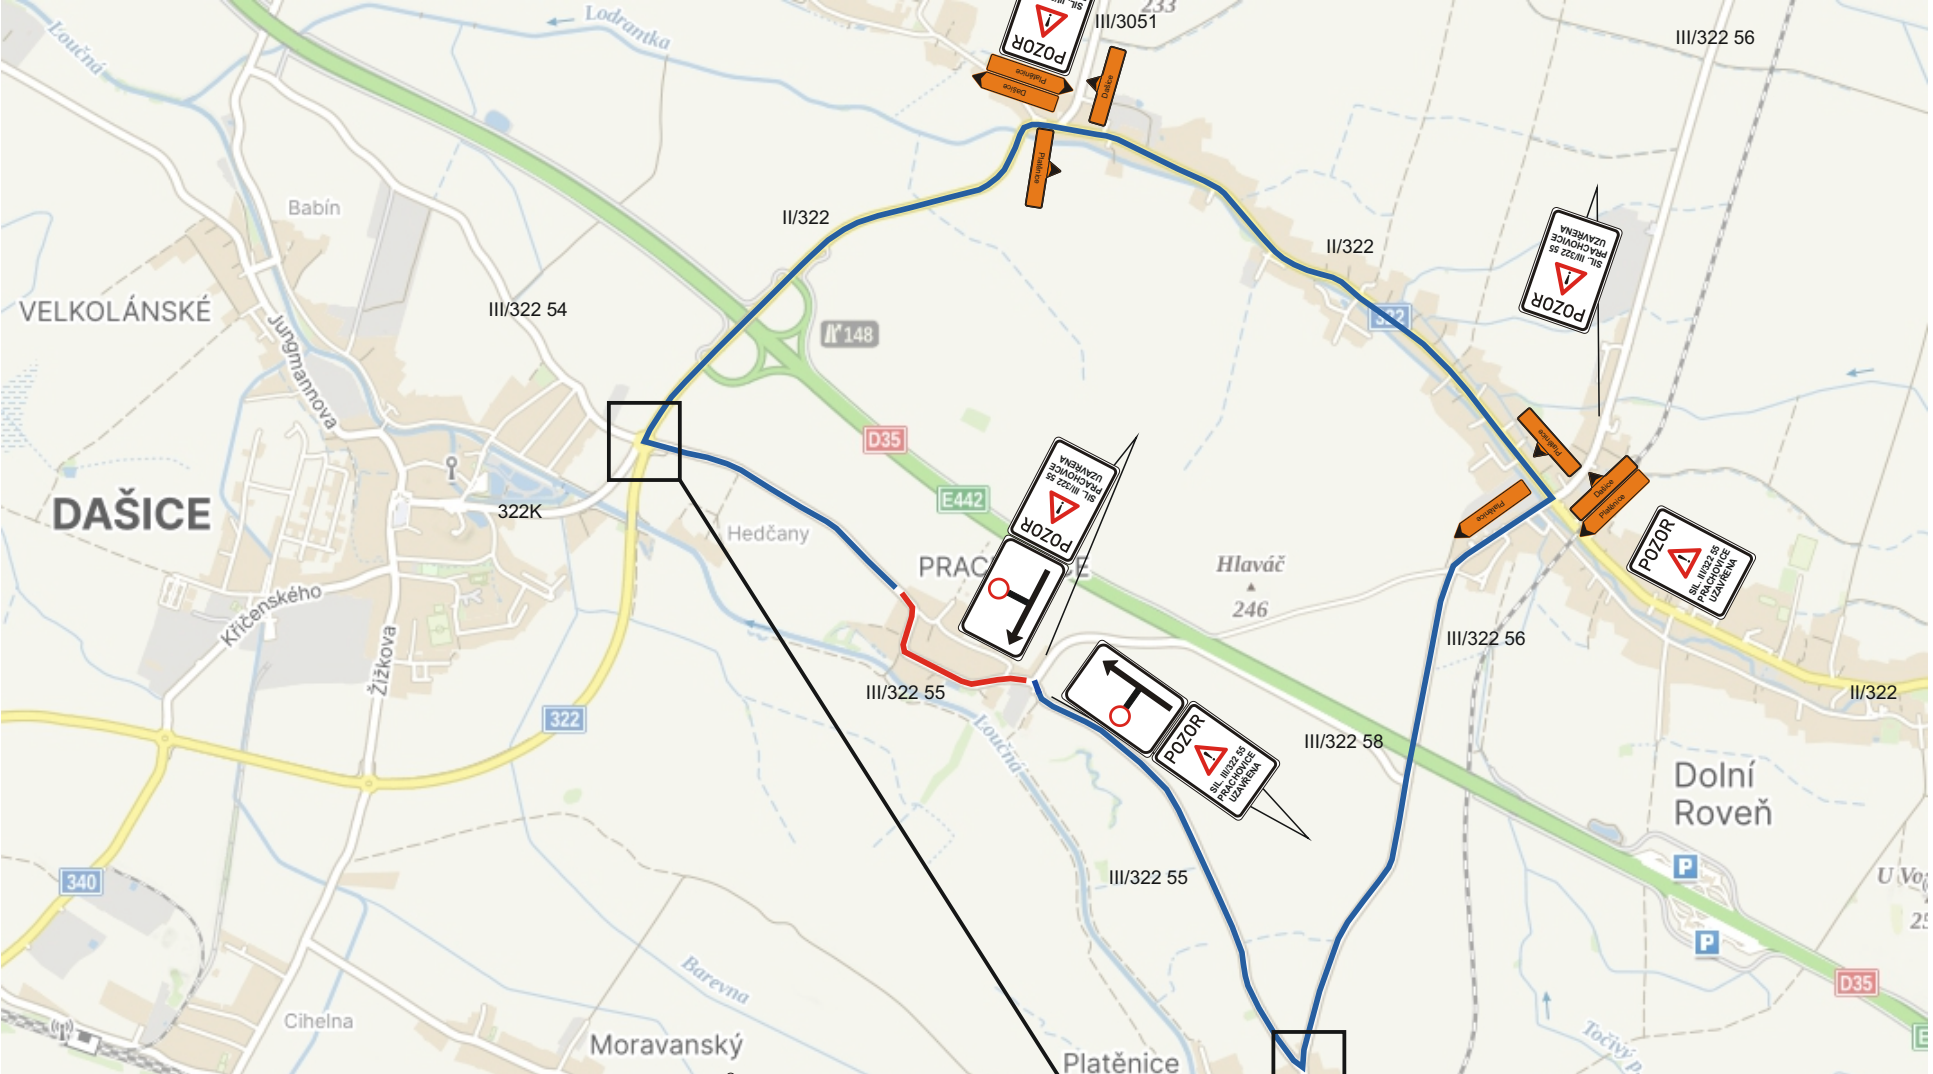

- IS 11b
- Platěnice
 - Platěnice
 - Platěnice
- IS 11b
- Dašice
 - Dašice
 - Dašice

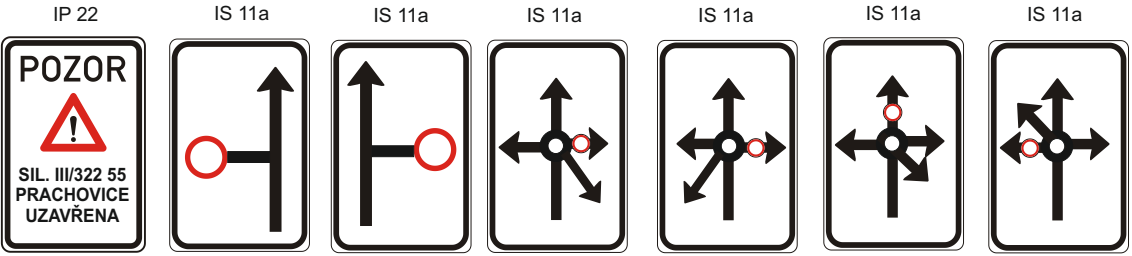

Zhotovitel:			
Kreslil:	Blanka Faltysová / tel.: 601 545 613	 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PARDUBICE s.r.o. Rosa 155 533 51 Pardubice IČO: 259 31 016 DIČ: CZ25931016 tel.: 603 115 936 e-mail: info@dzpce.cz web: www.dzpce.cz	
Zodp. projektant:	David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz		
Kontroloval:			
Kraj: Pardubický	Okres: Pardubice	Obec: Prachovice	
Akce:		Prachovice u Dašic - chodník	
		DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	
DATUM		04.02.2026	
Č. STAVBY		DIO	
STUPEŇ PD		DIO	
MĚŘÍTKO		4xA3	
FORMÁT		4xA3	

Výstavba chodníků Prachovice u Dašic sil. III/322 55

Stavba se dotýká silnice III/32255 na pozemku p.p.č. 349/1 a 349/6 v k.ú. Prachovice u Dašic ve vlastnictví Pardubického kraje, se kterou má právo hospodařit naše organizace.

Projektová dokumentace ve stupni DUR + DSP pro objednatele Město Dašice řeší výstavbu nového, levostranného chodníku podél silnice III/32255 od provozního staničení 1,46 km až po km 2,13 v intravilánu obce Prachovice u Dašic. Délka navrženého chodníku je 0,67 195 m.

Na asfaltovou vozovku silnice III/32255 se ze strany navrhovaného chodníku napojuje 2 x místní komunikace a na konci řešeného úseku silnice III/32258 ve směru na Dolní Roveň.

Stavba spočívá především ve vybudování nových chodníkových ploch včetně dotčených sjezdů. Na křížení s místní komunikací budou vybudovány nové zvýšené chodníkové přejezdy. Součástí PD je vyřešení odvodnění dešťových vod ze stávající komunikace a jejich napojení do stávající kanalizace. Dešťová kanalizace bude částečně rekonstruována z důvodu jejího špatného technického stavu, nebo nevyhovujících výškových poměrů.

Základní šířka chodníku je 1,60 (1,50 – 2,15) se sklonem do vozovky, sjezdy jsou řešeny dle stávajícího stavu, min. v šířce 3,35 m. Chodník bude v celé své trase, veden podél silnice III/32255, a to jednak jako odsazený (u č.p. 2) a jednak jako přimknutý (dle prostorových možností). V místě odsazení chodníku od silnice bude oddělen pruhem zeleně, která bude od silnice oddělena zvýšenou silniční obrubou (pruh zeleně bude sloužit pro odvodnění povrchových vod z chodníku), v místě přimknutí chodníku k silnici bude chodník od silnice oddělen zvýšenou silniční obrubou. Odvodnění povrchových vod z chodníku bude na silnici a dále potom do nově navržených odvodňovacích zařízení.

Upnutí chodníků v souběhu s vozovkou bude provedeno do nových silničních obrub s podsádkou + 12 cm do betonového lože s boční opěrou, v místě autobusové zastávky bude použito bezbariérových obrub s podsádkou + 16cm, v místech sjezdů budou použity nájezdové silniční obruby s podsádkou + 5 cm. Povrch chodníku bude ze zámkové dlažby.

Úprava silnice III/32255 - napojení chodníku na stávající kryt komunikace bude realizováno o konstantní šířce 1,00 m. Odfrézovaný pruh vozovky bude obnoven asfaltobetonovou směsí (vyrovnávka + kryt).



Zastávky BUS - jedná se o rekonstrukci stávající zastávky BUS mezi čp. 4 a č.p.5. V místě zastávky bude silniční obruba zvýšena na +16cm od nivelety silnice – vznikne bezbariérová úprava nástupní hrany. Zastávka je přimknutá k chodníku a bude situována do prostoru jízdního pruhu silnice. Nástupní plocha zastávky bude tvořena nástupní plochou 3,45 x 3,5 m. Do nástupní plochy zastávek budou stavebně osazeny prvky pro bezpečný pohyb tělesně a zrakově postižených (dle 398/09Sb.) - signální a vizuální pásy.

Odvodnění – v intravilánu obce Prachovice u Dašic je stávající dešťová kanalizace, která bude na základě kamerových prohlídek rekonstruována včetně nových kanalizačních přípojek od nově osazených uličních vpustí (prefabrikované betonové uliční vpusti s litinovou mříží).

Výstavba chodníků Prachovice u Dašic sil. III/322 55

termín: 2.3. - 31.5.2026


- uzavřený úsek 700m
- obslužná trasa dopravce, kterému bude umožněn průjezd od Dašic od čp. 36-25 a od Moravan od čp. 24-37, obousměrně

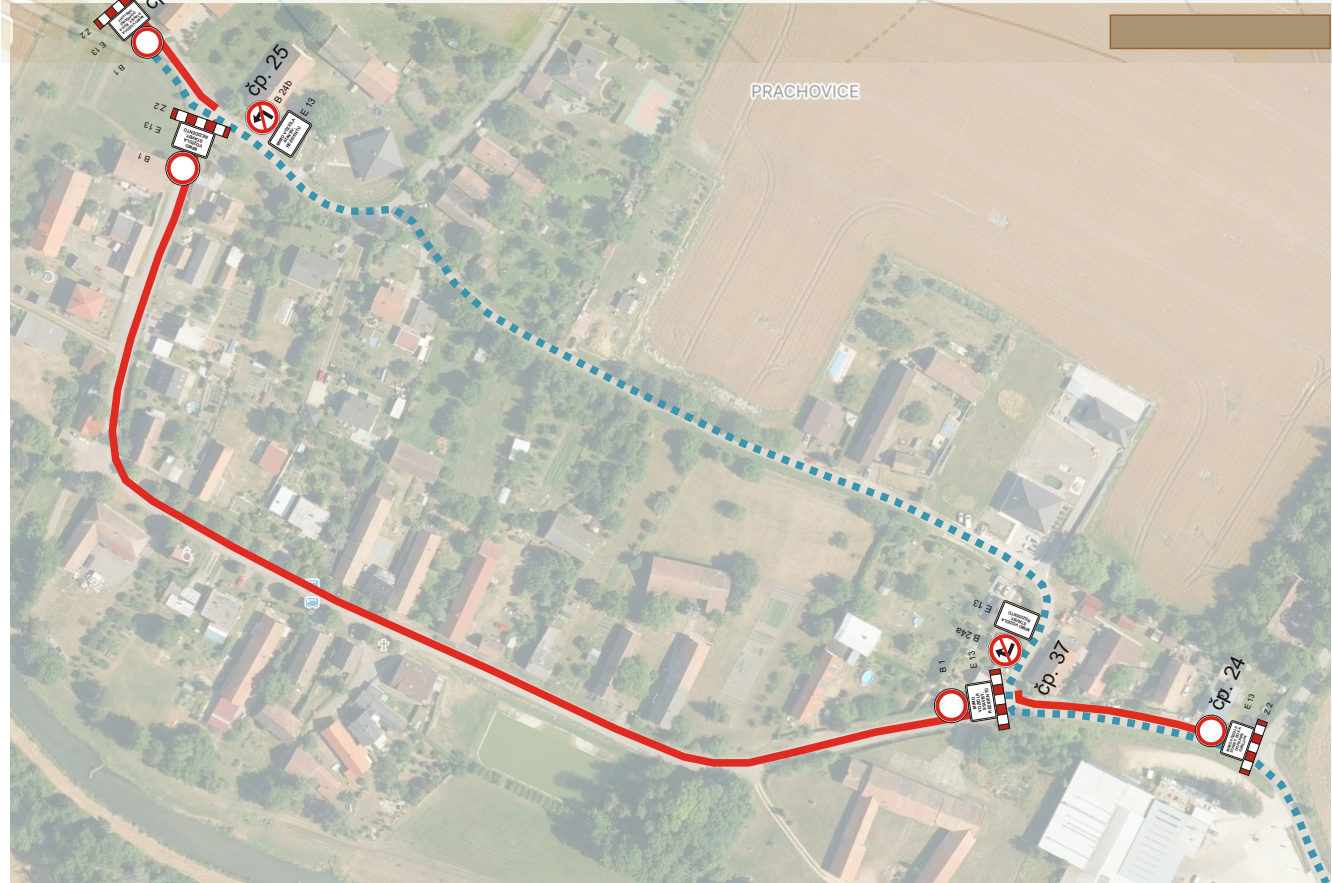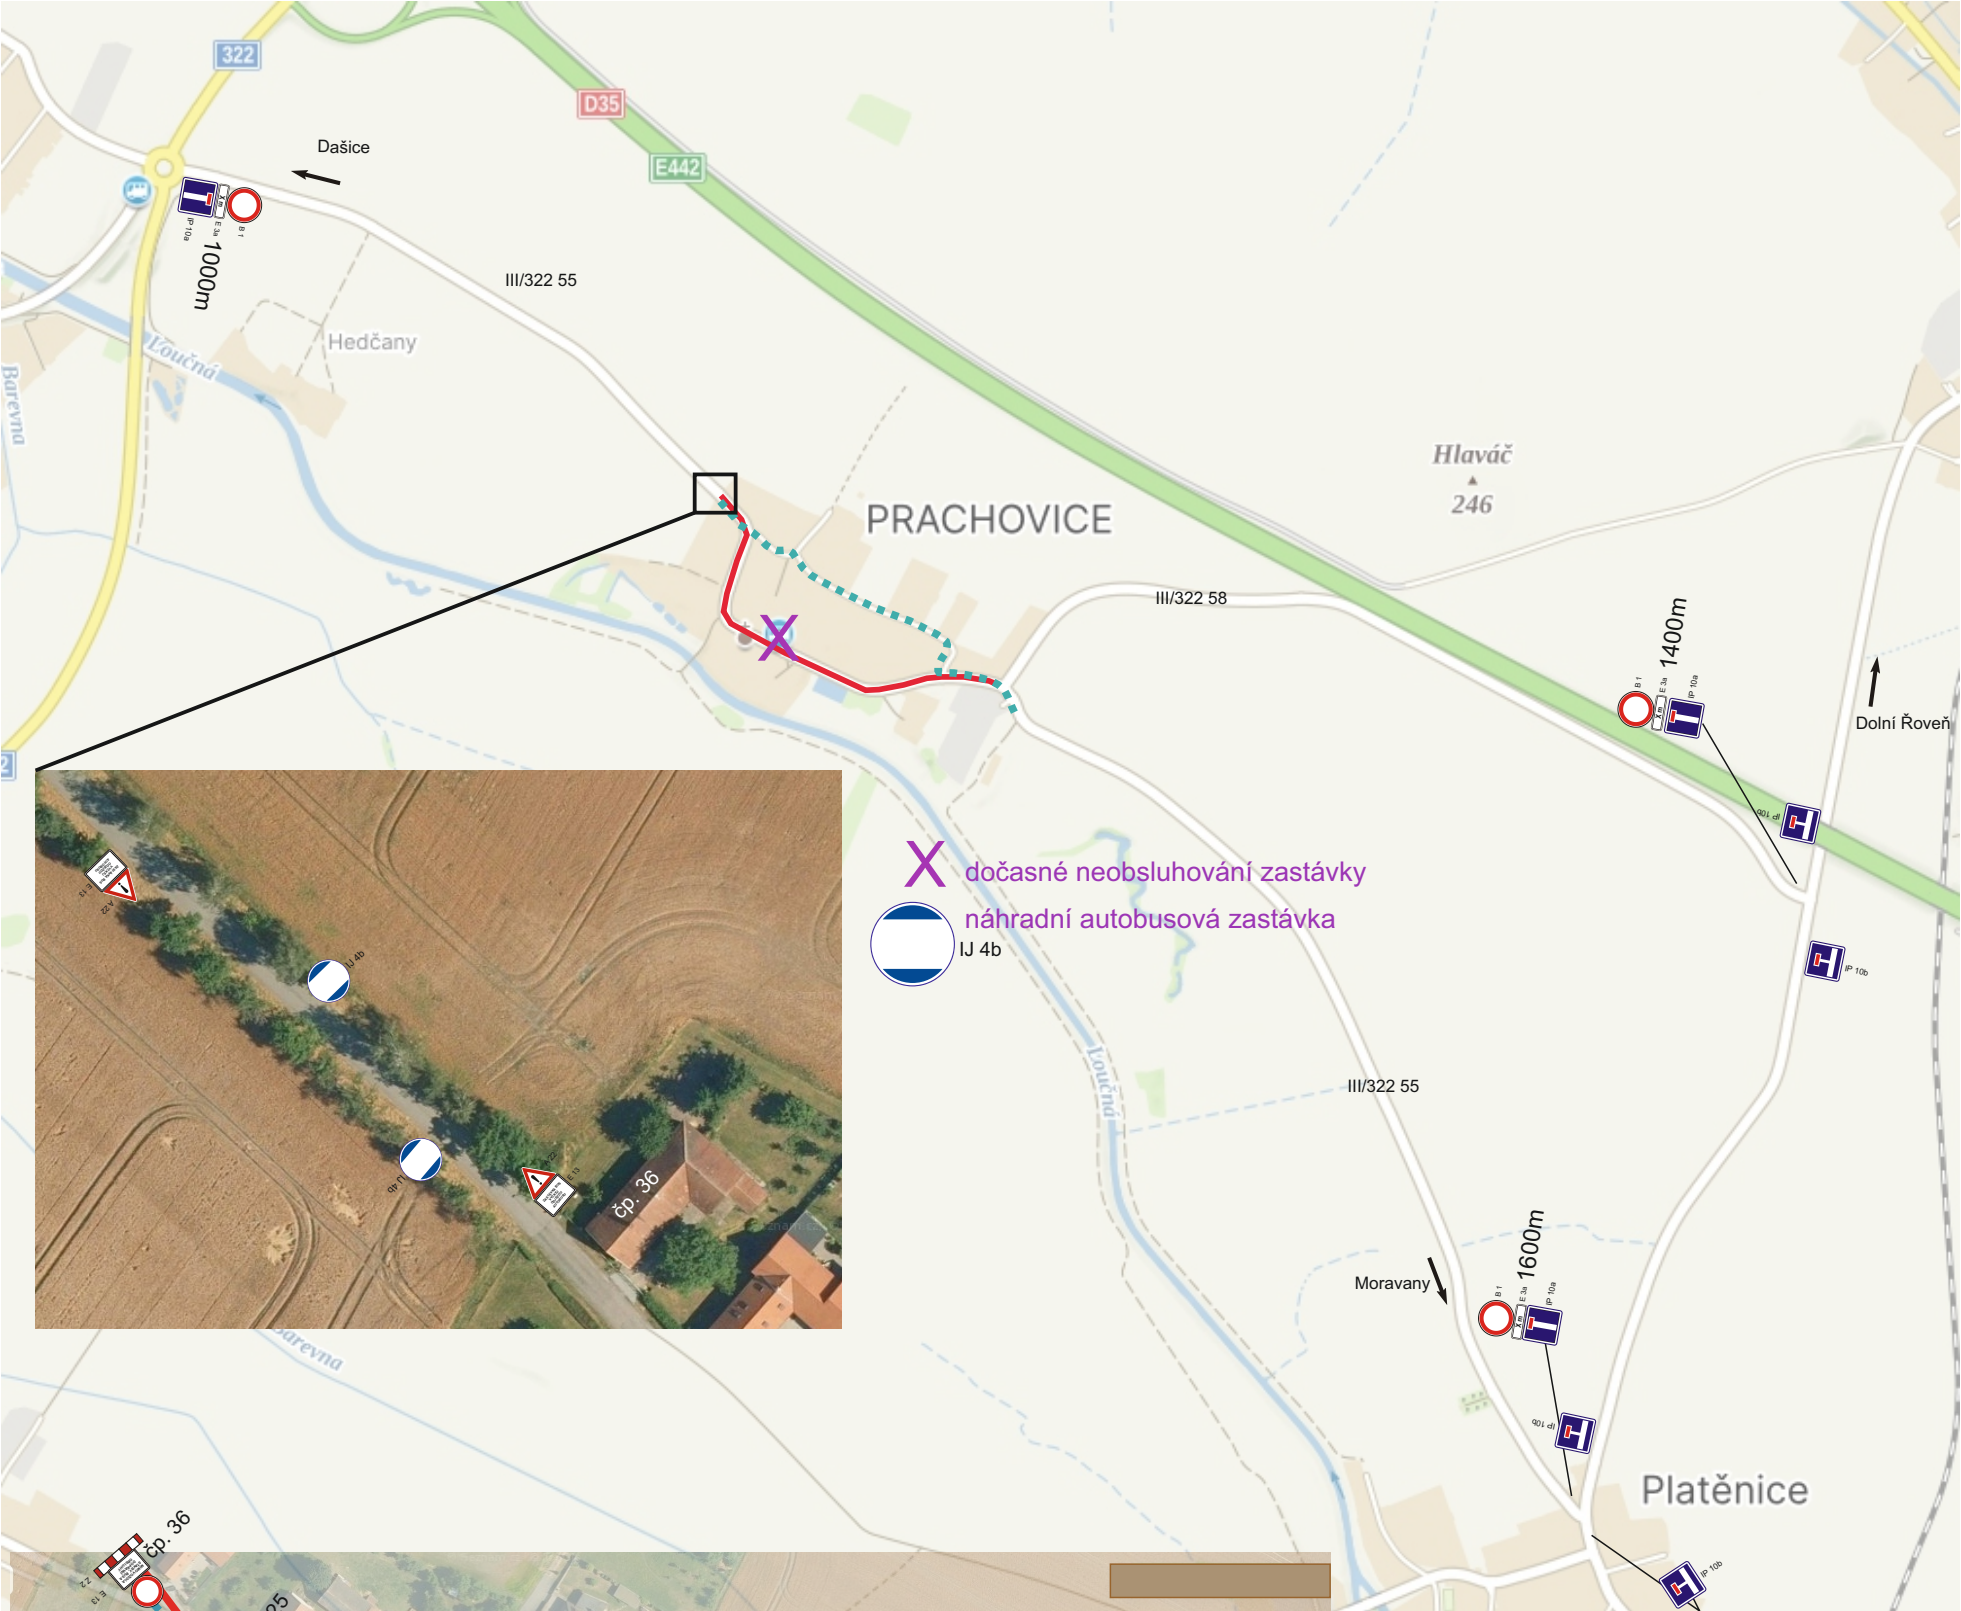

- | | |
|---|---|
| 
B 1 | 
B 1 |
| 
E 13 | 
E 13 |
| 
Z 2 | 
Z 2 |
| 
B 24a | 
B 24b |
| 
E 13 | 
E 13 |
| 
B 1 | 
IP 10a |
| 
E 3a | |
| 
IP 10b | 
IP 10b |
| | 
IJ 4b |

Výstavba chodníků Prachovice u Dašic sil. III/322 55

termín: 2.3. - 31.5.2026



Vymístění vozidel - osazení
DZ 7 dní
před plánovanými pracemi.

Výstavba chodníků Prachovice u Dašic
sil. III/322 55

termín: 2.3. - 31.5.2026

pracovní posuvné místo na úseku uzavírky sil. III/322 55

